

Kantonaler Setup zu Justitia 4.0

Unser Projekt Smart Justice


Ein Bericht aus dem Kanton Thurgau
zum Erfahrungsaustausch mit Projektleitenden anderer Kantone
und Organisationen

01.12.2023 / Cornel Müller

Unsere Reise ins digitale Zeitalter



Zentrales Projekt



organisorisch
angegliedert

Obergericht




Cornel Müller
Projektleiter Smart Justice




cornel.mueller@tg.ch

Die Entstehung des Projekts Smart Justice

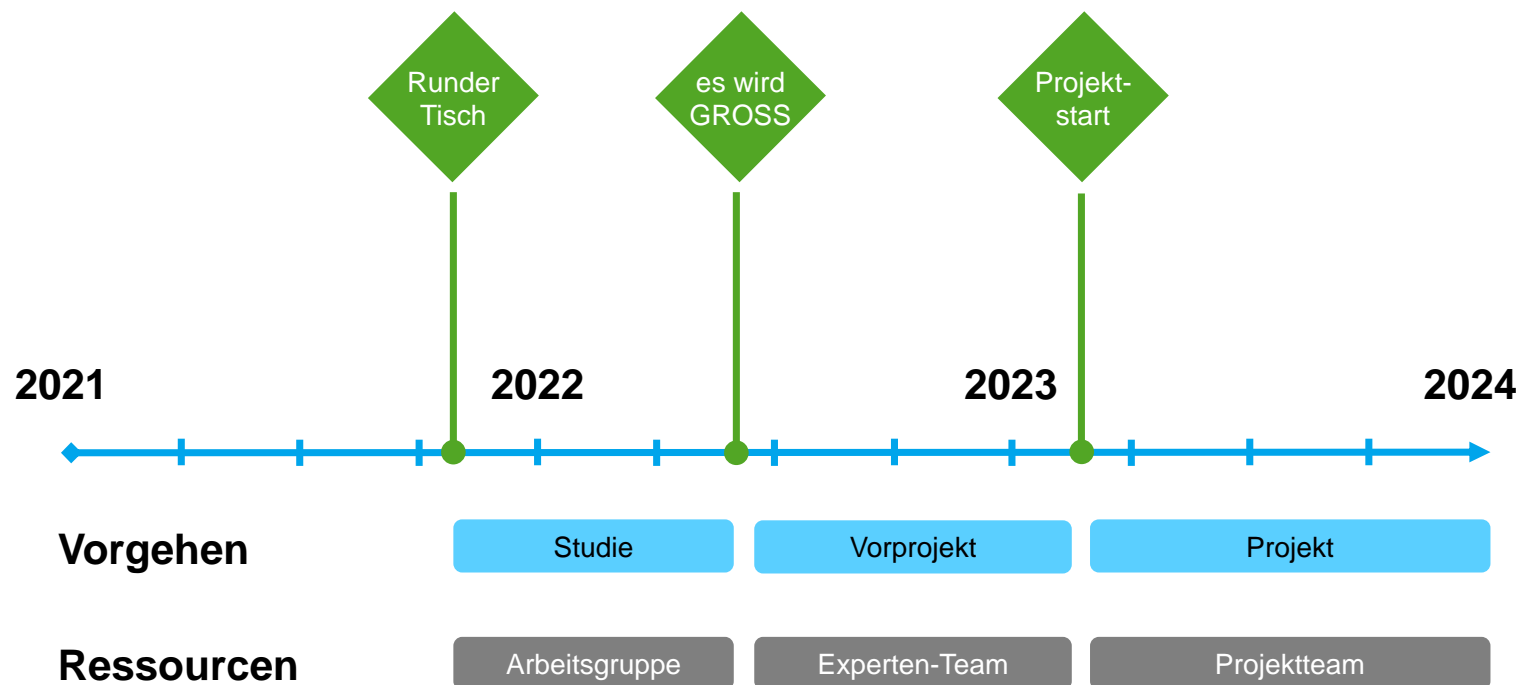

Wie planen wir das Projekt?

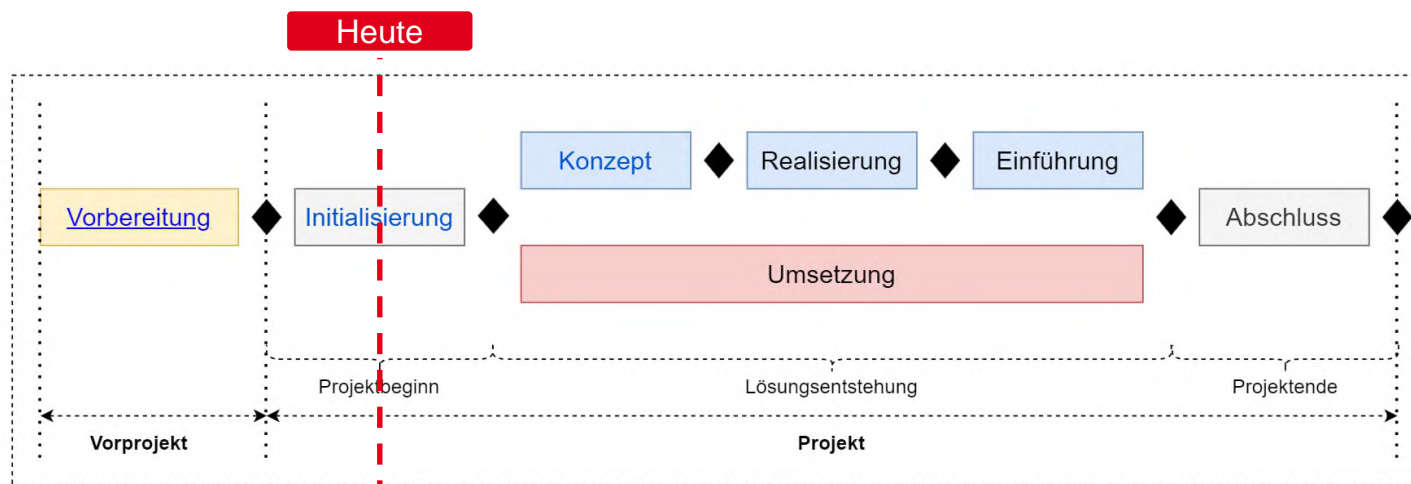

Phasenmodell Projekt Smart Justice

angelehnt an HERMES-Projektlebenszyklus (www.hermes.admin.ch)

- HERMES 2022 als Projektmanagementmethode in der Informatik
- Offener Standard zur Führung und Abwicklung von IT-Projekten
- Leitlinie für Projektauftraggeber, Projektleiter und Projektmitarbeiter
- Vorteil von klar definierten Aufgaben, einheitliches Verständnis von Verantwortlichkeiten und erwarteten Ergebnissen

Wie planen wir die konkreten Aufgaben?

Suche ...
☰

Gantt-Diagramm
+ Erstellen
Enthaltene Projekte 1
Filter 1
Gantt

ID	TYP	THEMA	STATUS	ANFANGSTERMIN	ENDTERMIN	2022												2023												2024												2025											
						Q1	Q2	Q3	Q4	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5123	PHASE	Initialisierungsphase	In progress	01-03-2023	24-11-2023	[Gantt chart showing bars for Initialisierungsphase, Projektplanung, Informatiksysteme, Digitale Transformation, FFA, Variantenanalyse, Aufbau & Durchführung Koordinatio..., Geschäftsabläufe]																																															

Aktionsboard (Zugewiesen an)

Zugewiesen [Avatar]

+

In progress #5164 - Digitalisierung J...

TASK Situationsanalyse der Ämter (Aufnahme Ist-Situation)

RW 13. März - 18. Aug. 2023

In progress #5167 - Digitalisierung J...

TASK Varianten konkretisieren

RW 13. März - 24. Aug. 2023

Zugewiesen [Avatar]

+

In progress #5158 - Digitalisierung J...

USER STORY Aufbau & Durchführung Koordinationsgespräche

DR 2. Mai - 5. Sept. 2023

In progress #5168 - Digitalisierung J...

TASK Analyse Variante 1: JURIS 4 anpassen

DR 3. Apr. - 24. Aug. 2023

Zugewiesen [Avatar]

+

New #5143 - Digitalisierung Justiz Th...

TASK Kommunikation Variantenentscheid


CM 4.-15. Sept. 2023

New #5144 - Digitalisierung Justiz Th...

TASK Kommunikation Entscheid Durchführungsauftrag

CM 22.-24. Nov. 2023

Unser identifizierter Handlungsbedarf

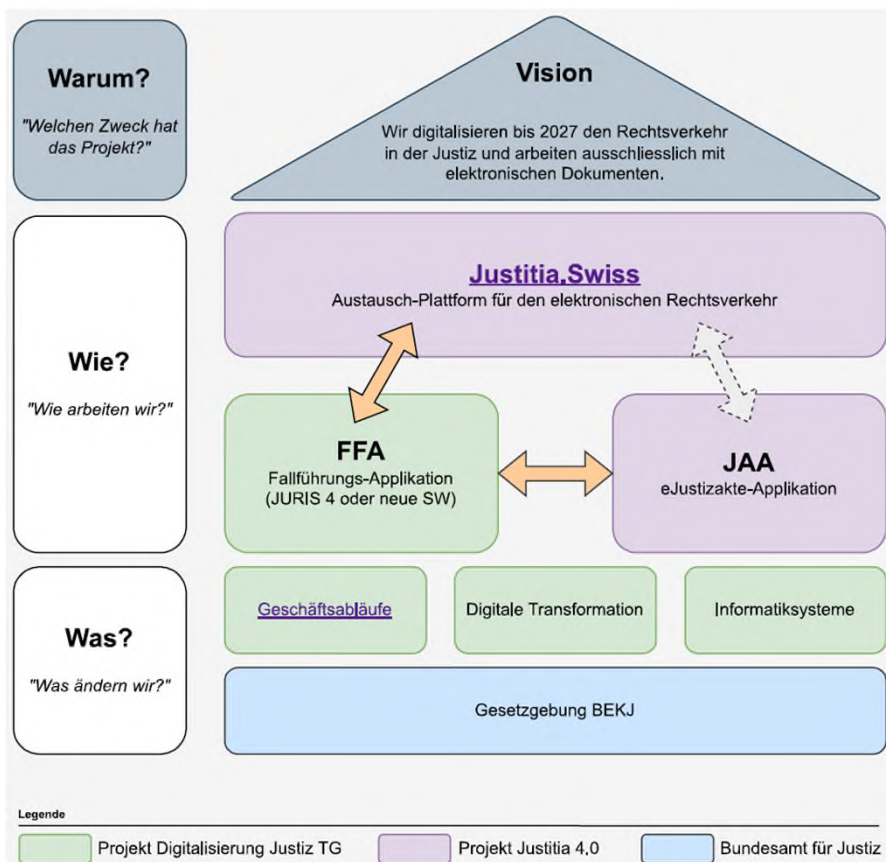

Geschäftsabläufe

Umstellung auf eine digitale Arbeitsweise in der kantonalen Justiz

Digitale Transformation

Anpassung der Arbeitsabläufe an die digitalen Anforderungen

Informatiksysteme


Bereitstellung der nötigen Infrastruktur an den Arbeitsplätzen und Wirkungsstätten

**FFA
Fallführungs-Applikation**


Einführung / Ablösung einer FFA, welche die zukünftigen Anforderungen erfüllt

Unser Weg der digitalen Transformation


Mit dem Einsatz neuer Technologien werden bestehende Geschäftsabläufe verändert, neu gedacht oder optimiert, damit ein Mehrwert für die Organisation entsteht.




Wer ist involviert?

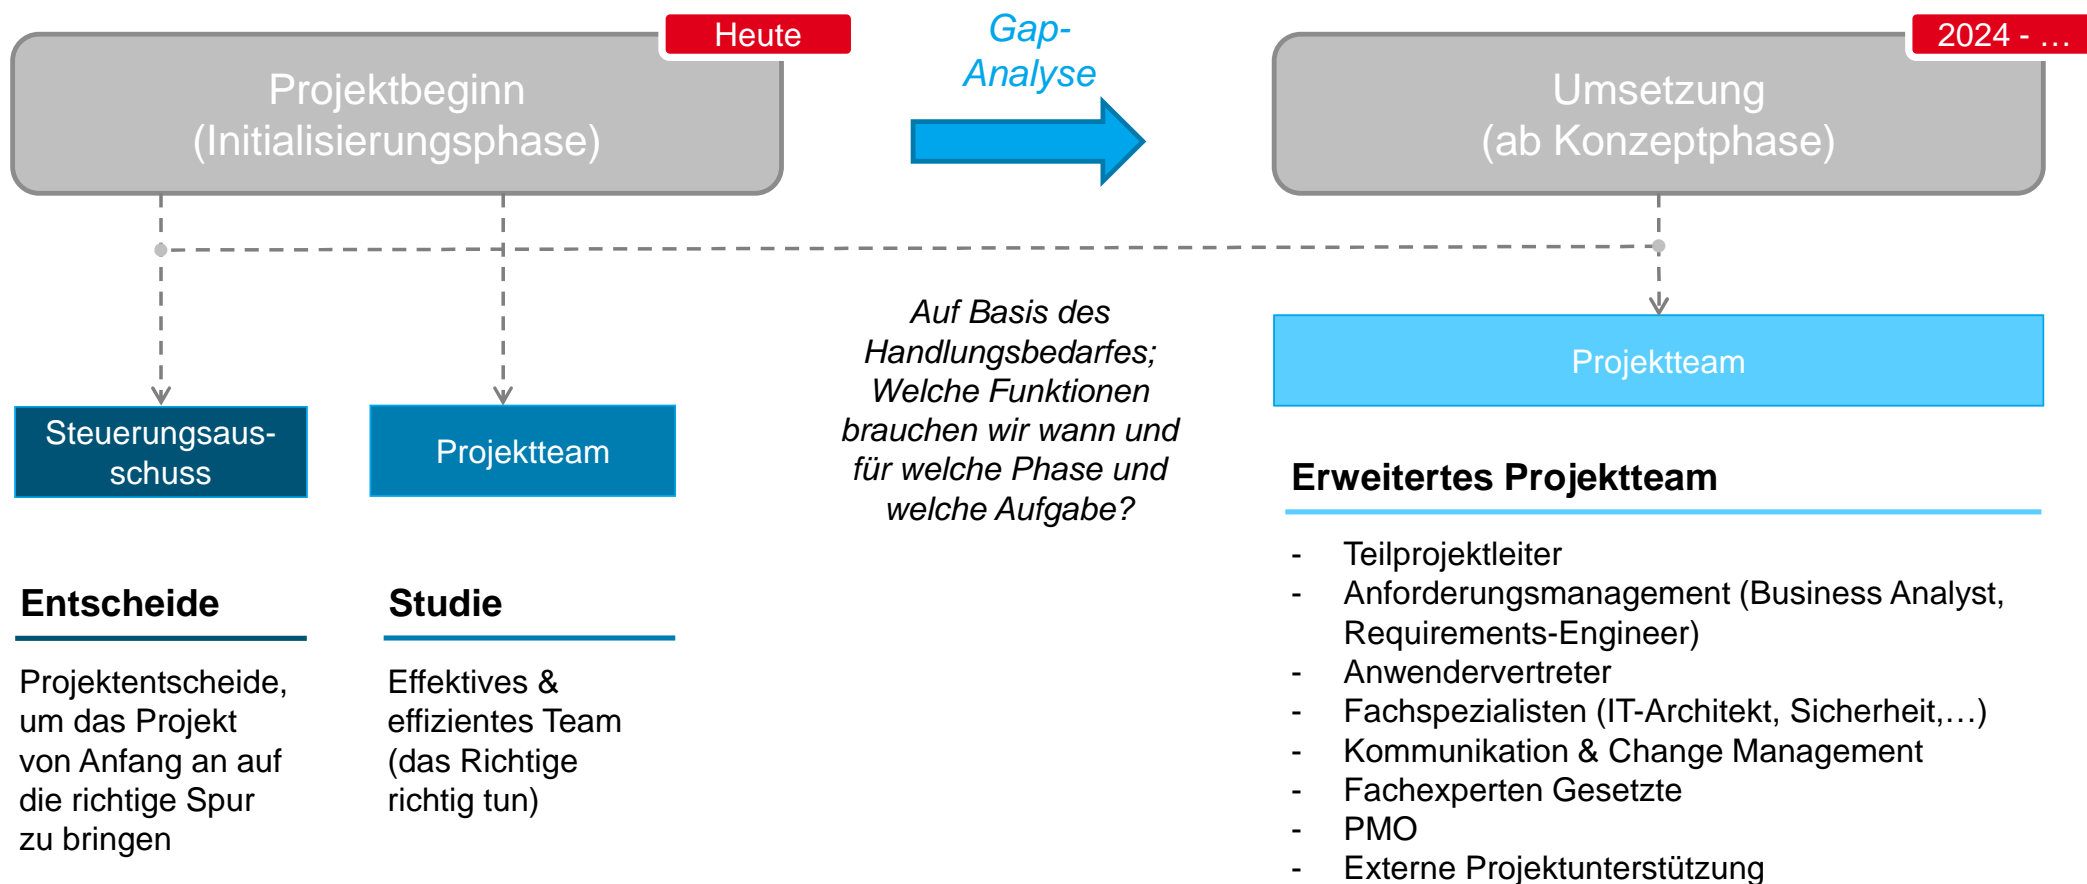


Die Projektorganisation und ihre Teilprojekte

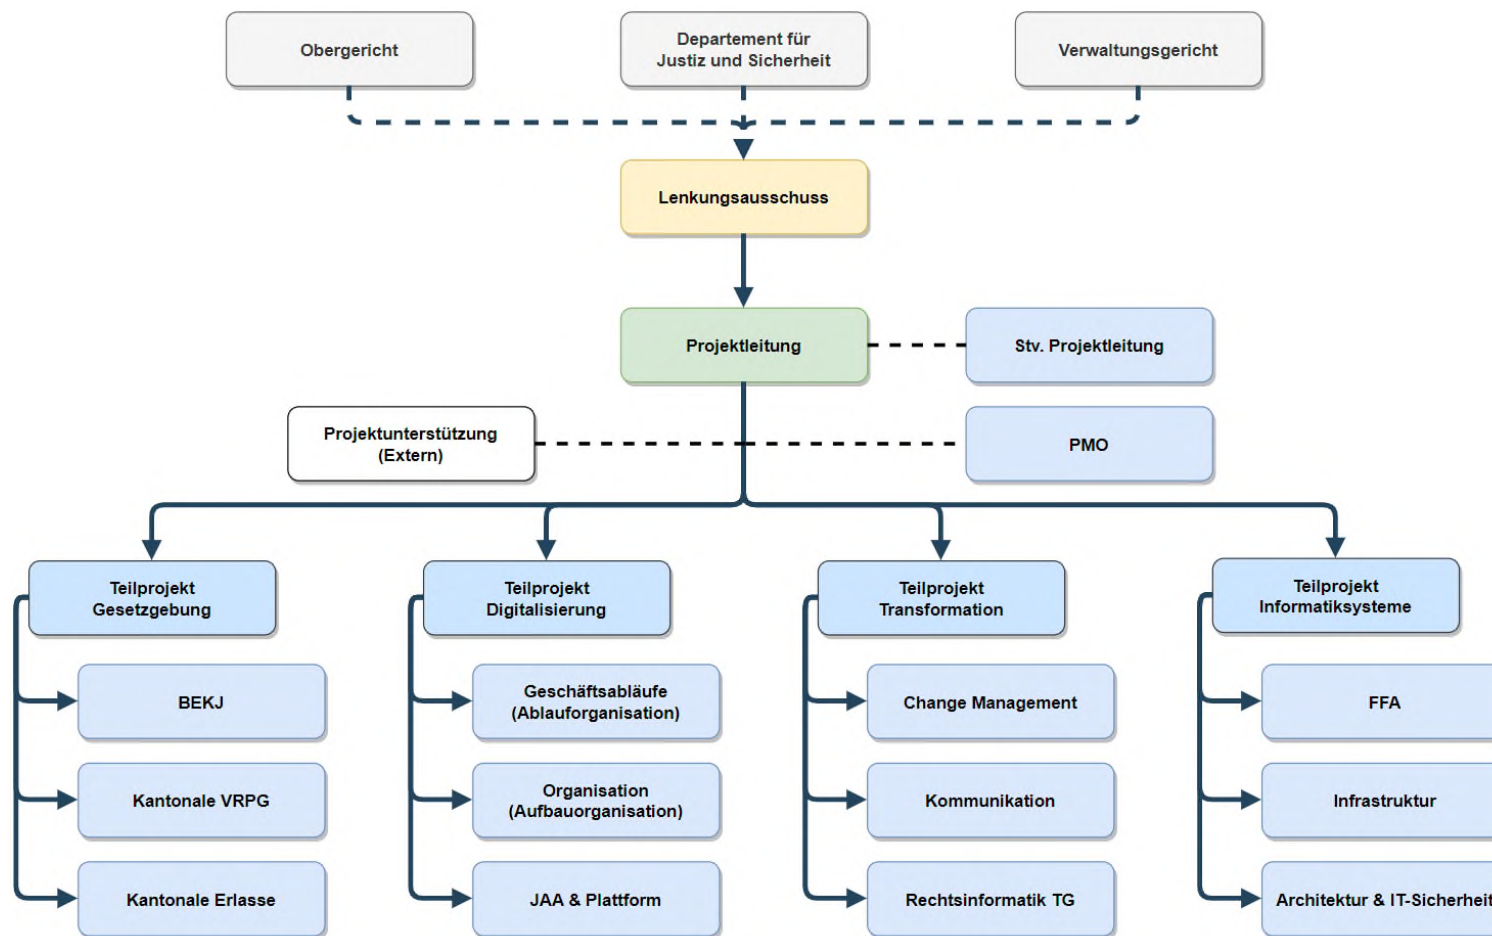

Eine Roadmap entsteht

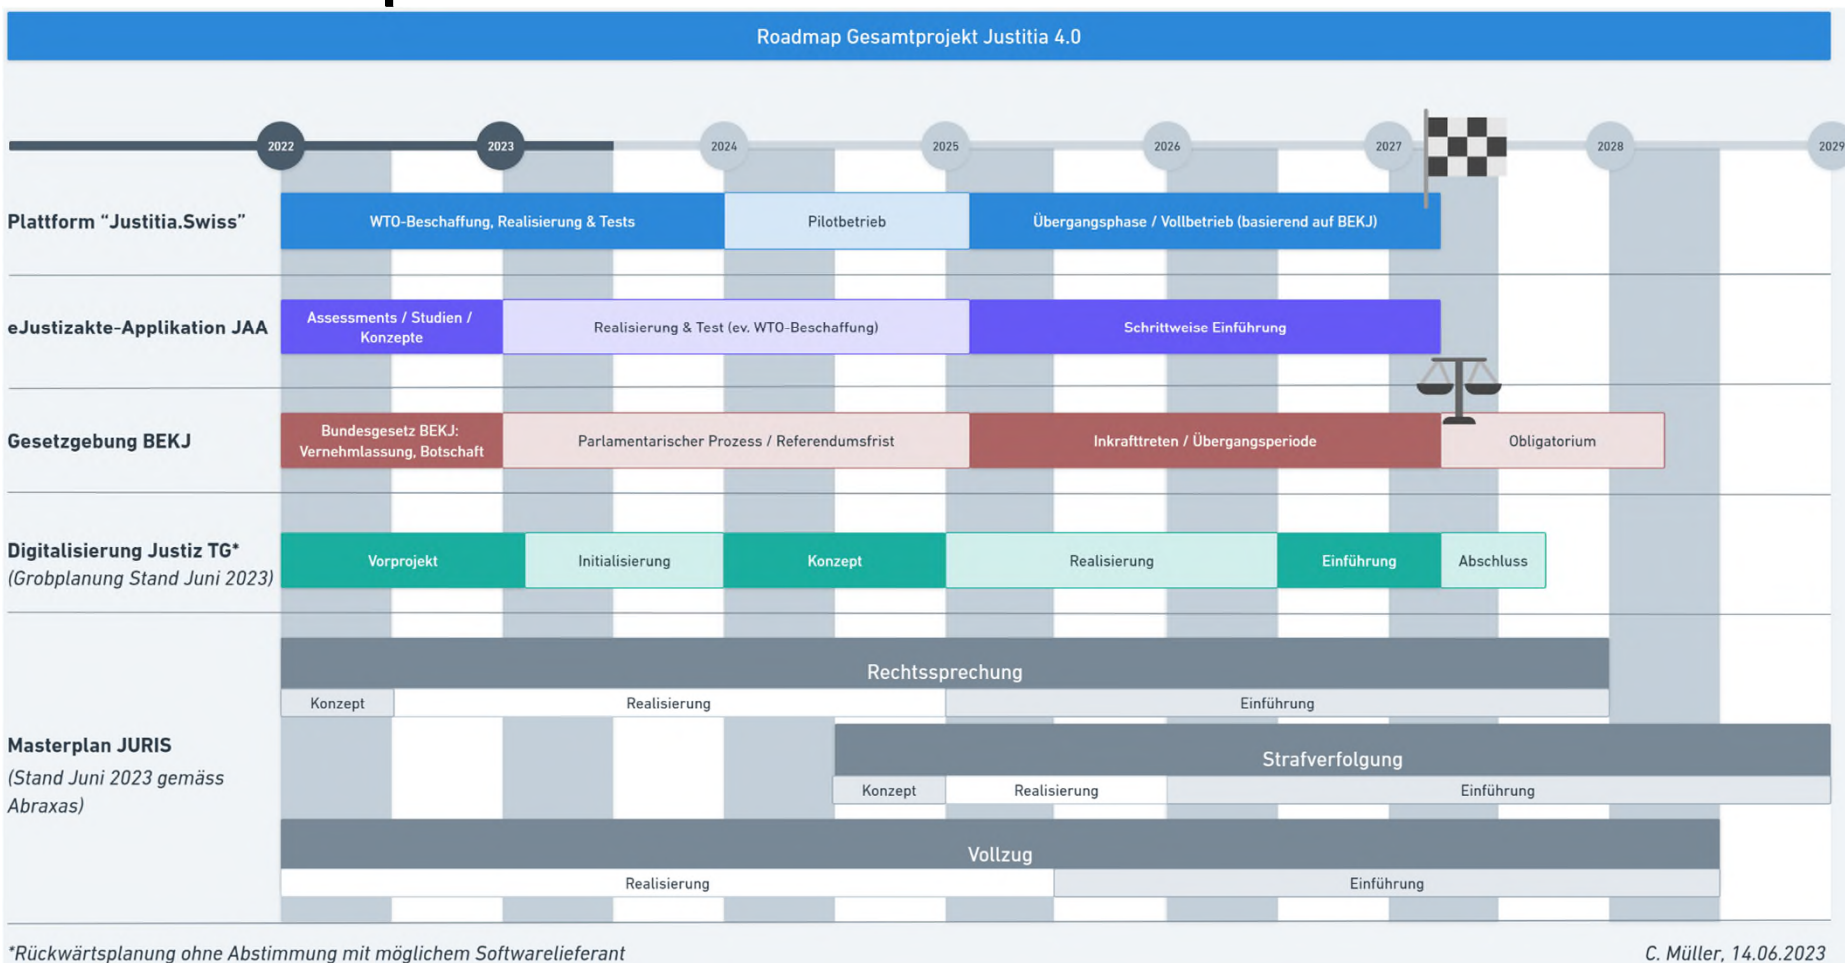

Positive Effekte unserer Kommunikation



Die bisherigen (persönlichen) Herausforderungen



«Projektleiter vor Hindernissen», Bild generiert von DALL-E, 27.11.2023

- **Entscheidungsträger** für die Veränderungen gewinnen
- Einarbeitung in die **Themenvielfalt** und inhaltliche Verortung
- **Kennenlernen** der zentralen **Stakeholder** der CH-Projekte und Lieferanten
- Förderung der **stufengerechter Kommunikation** (Kommunikationsplattform)
- Einplanung der **Anwendervertreter** in das Projekt

Lessons Learned



- Sehr gute Erfahrung des engen **Austausches** zwischen **Ambassadoren** und der Projektleitung.
- Vielfalt und Komplexität der Themen nicht immer einfach unter einen Hut zu bringen. Zur richtigen Zeit mit der richtigen **Flughöhe** die Themen angehen.
- **Change-Management** als wichtiges Instrument setzen wir **gezielt** ein.
- Eine Applikation & Methode für die Projektplanung hilft uns, um die **Effektivität & Effizienz im Projektteam** sicherzustellen.
- Projektmitarbeiter für das Projekt zu **rekrutieren** braucht Zeit. Wir kümmern uns **frühzeitig** darum.

«Lessons Learned», Bild generiert von DALL-E, 27.11.2023

Fragen & Diskussion



**Vielen Dank
für Ihre Teilnahme**

